



www.kic-odpady.cz

Stav projektu KIC

Ing. Tomáš Kotyza
duben 2012





Aktuální stav


KIC Odpady, a.s. – akcionáři: MSK, statutární města Ostrava, Karviná, Havířov, Opava, Frýdek-Místek a obec Horní Suchá

- **Kapacita:** 192 000 t/rok komunálního odpadu
- **Počet technologických linek:** 2
- **Roční fond provozní doby:** 8 000 h
- **Energetické využití:** kombinovaná výroba el. energie a tepla
- **Dodávka do el. sítě:** 3 x 6,3 kv, 50 Hz
- **Dodávka tepla:** 1,1 MPa / 230 °C
- **Technologie:** roštové spalování odpadu
- **Životnost:** stavební části cca 50 let
technologické části cca 25 let

PROJEKT KIC

Investor
KIC Odpady, a.s.

Investor
města

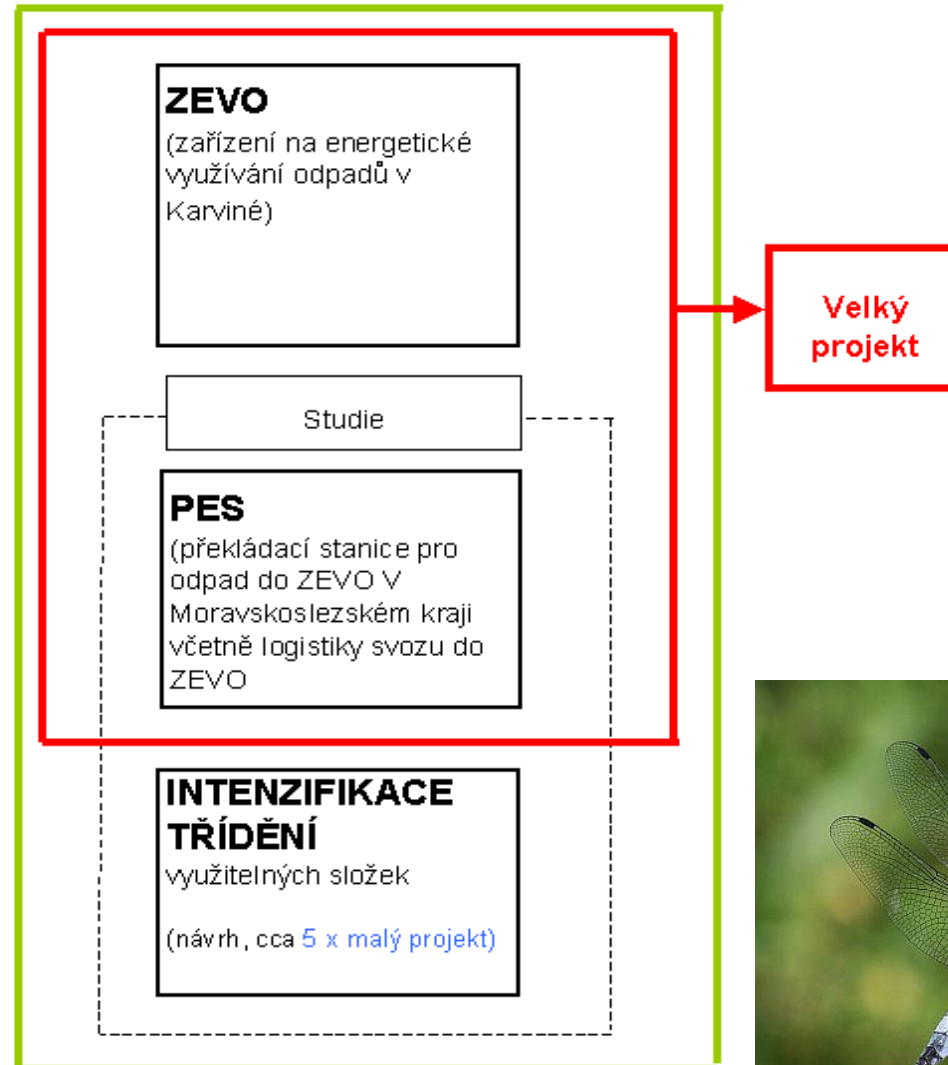

Fáze	Oblast práce	Úkol	2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Přípravná fáze	Studie proveditelnosti	Studie proveditelnosti	[Red bar from I-III 2008]																															
		Zhotovení projektové dokumentace OUP	[Red bar from I-III 2008]																															
		Posouzení vlivů zájemů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění včetně sběrového (OSP)	[Red bar from I-III 2008]																															
		Zpracování územního rozhodnutí - územní řízení	[Red bar from I-III 2008]																															
		Zhotovení projektové dokumentace - ÚSP	[Red bar from I-III 2008]																															
		Zpracování projektové dokumentace - stavební řízení	[Red bar from I-III 2008]																															
	Příprava Žadostí I u všech úřadů příslušných příloh	Příprava Žadostí I u všech úřadů příslušných příloh	[Red bar from I-III 2008]																															
		Koncese řízení projektů	[Red bar from I-III 2008]																															
		Schválení koncepního projektu	[Red bar from I-III 2008]																															
		Zpracování záložní dokumentace	[Red bar from I-III 2008]																															
		Schválení záložní dokumentace kralem	[Red bar from I-III 2008]																															
		Schválení záložní dokumentace OPŽP	[Red bar from I-III 2008]																															
		Koncese řízení	[Red bar from I-III 2008]																															
		Schválení koncepní smlouvy	[Red bar from I-III 2008]																															
Jaderná o řezovací a příslušná část	Posouzení Žadostí I orgány v ČR	[Red bar from I-III 2008]																																
	Posouzení Žadostí I Evropskou komisí	[Red bar from I-III 2008]																																
	Rozhodnutí příslušných orgánů o přidělení dotace	[Red bar from I-III 2008]																																
	Uzávěření smlouvy s Dodavatelem	[Red bar from I-III 2008]																																
	Vylání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP	[Red bar from I-III 2008]																																
	Uzávěření práce včetně realizační dokumentace	[Red bar from I-III 2008]																																
Investiční fáze	Investiční fáze	2008	[Red bar from I-III 2008]																															
	Realizace díla	[Red bar from I-III 2008]																																
	Začlenění provozu	[Red bar from I-III 2008]																																
	Průběh a kolaudace	[Red bar from I-III 2008]																																
Provozní fáze	Provozní fáze	[Red bar from I-III 2008]																																

2015
2008

- Červen 2008** - studie proveditelnosti
- Říjen 2008** - založení a.s. k řízení projektu
- Prosinec 2009** - stanovisko EIA
- Březen 2010** - územní rozhodnutí
- Březen 2010** - podání žádosti o dotaci z OPŽP
- Listopad 2010** - stavební povolení
- Listopad 2010** - integrované povolení (IPPC)
- Srpen 2011** - výběr zhotovitele
- Duben 2012** - září 2014 - REALIZACE DÍLA
- Říjen 2014** - zahájení zkušebního provozu
- Říjen 2015** - KOLAUDACE



(studie proveditelnosti, založení akciové společnosti KIC Odpady)

- 2009 změna POH ČR ⇒ Změna POH MSK



- 2010 XV. výzva MŽP, prior. osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady, kontinuální příjem žádostí od 4.1.2010 do 30.6.2011





Jaká je realita?

**2010 XV. výzva MŽP, prior. osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
kontinuální příjem žádostí od 4.1.2010 do 30.6.2011 (předpoklad
podpory 40% uznatelných nákladů)**

KIC – zpracování žádosti do OPŽP

**Zjištění centrálních orgánů, že dle pravidel pro poskytování veřejné
podpory podle regionální blokové výjimky nelze poskytnout
podporu 40%, 6.1.2011 ČR odeslala EK k notifikaci nová pravidla
pro poskytování veřejné podpory podle pravidel pro Životní
prostředí**

KIC – přepracovává kompletně žádost a podává na SFŽP

**V únoru 2012 Evropská komise sděluje ČR, že „takto teda ne“ a
doporučuje návrat k regionální podpoře, avšak s mírou podpory cca
20%, avšak značně nejistých**

**- MŽP do dnešního dne nestabilizovalo legislativní prostředí
nezbytné pro řádnou CBA projektů (poplatky za odpady, apod.)**

Důsledek?

- Zdržení v přípravě projektu 2 roky a po celou dobu zdržení



- - v jednání s Evropskou investiční bankou
- - v jednání s komerčními finančními ústavami a případnými strategickými partnery
- V konečném důsledku prakticky nerealizovatelnost projektu v programovacím období 07-13 podle původního schématu financování resp. s dotací
- Neplnění závazků ČR
- Zmařené prostředky na neustálé přetváření žádosti

Projektová příprava

- **Výstavba 3 překládacích stanic – samostatné projekty, které doplňují stěžejní projekt KIC**
- **Vydáno ÚR k překládací stanici Frýdek-Místek (PM 5.9.2011) a Ostrava – Hrušov (PM 8.9.2011), k překládací stanici Opava – Holasovice řízení probíhá (předpoklad vydání duben 2012)**
- **Plnění podmínek souhlasného stanoviska EIA (MŽP, 8.6.2010)**
 - **dokončeno měření imisního pozadí**
- **příprava pro výběr zhotovitele (celý rok 2011)**
 - **dokončení zadávací dokumentace pro tendr (11/2011)**
 - **posouzeno SFŽP, nyní MF**

Projektová příprava

- „Hrubé terénní úpravy“ v rámci záměru KIC – ÚR vydáno 13.5.2011, OS FRYGATO-EKO podalo odvolání, nabytí PM 19.8.2011
- ÚR na vlastní stavbu KIC vydáno 27.5.2011, podána odvolání, nabytí PM 15.9.2011, následná žaloba Horní Suché, OS Arnika, OS Hnutí DUHA – Přátelé země Česká republika
- KS Ostrava přiznal odkladný účinek žaloby proti územnímu rozhodnutí na KIC jen na základě podané žaloby a s odkazem na to, že žalobce „Hnutí DUHA - přátelé Země Česká republika“ napadá i správnost stanoviska EIA. Byla namítána nenahraditelná újma, zejména zásahem do biotopu vzácné a ohrožené Vážky plavé (*Libellula fulva* Muller) v nádrži Mokroš.

- **Soud se dopustil hned několika pochybení:**
 - **k návrhu na přiznání odkladného účinku si předtím nevyžádal vyjádření žalovaného krajského úřadu, byť to § 73 odst. 2 soudního řádu správního výslovně předpokládá,**
 - **nezohlednil nové znění § 23 odst. 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podle něhož je odkladný účinek žaloby vyloučen (nelze se proto ani odkazovat na předchozí judikaturu NSS, jak KS učinil, když tato je v důsledku uvedené změny zákona již nepoužitelná).**



Dále lze dodat, že:

- vážka plavá ani není podle práva České republiky zvláště chráněným druhem živočichů,**
- KIC není umístován namísto nádrže Mokroš, ta zůstává (soud ale neměl při rozhodování k dispozici spis ani si neopatřil vyjádření krajského úřadu), přitom ovšem nikdo nenapadl samostatné územní rozhodnutí pro hrubé terénní úpravy na KIC.**



Strategie dalšího postupu projektu KIC

Sdělení EK k podpoře ZEVO + 24.2.2012 jednání na MŽP

**Žádost podána v souladu
s XV. výzvou MŽP podle
pravidel OPŽP
(akceptace SFŽP)**

**Složité proces vypořádávání
s JASPERS**

NE podle pravidel ŽP (dotace cca 40 %)

Regionální podpora (dotace cca 20 %)

Nutno individuální notifikací

Nevyjednán Bridge Projekt (nelze prodloužit po r. 2015)

HLAVNÍ PROBLÉMY

INVESTIČNÍ NÁKLADY ve výši cca 1 mld. Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY v r. 2013 – 2016 ve výši cca 300 mil. Kč

ČAS

Program. období r. 2007 – 2013 +2

Další program. období

Jaké budou podmínky výzvy ?

VARIANTY ŘEŠENÍ

Zastavení projektu

Pokračování projektu

Stejným způsobem (akcionáři)

Vstup strategického partnera

Investice 50 mil.Kč na proj. přípravu + sanace ztrát

V horizontu 3 měsíců, dohodnutí podmínek



Děkuji za pozornost

